



Politisk følgegruppe

31. januar 2025

Dagsorden:

1. Nyt fra skadesstedet

v. Projektleder Camilla Sieg og Johnni Hald Sørensen

2. Juridiske forhold

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

3. Økonomi

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

4. Tidslinje for det videre arbejde

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

5. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe i 2025

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

6. Eventuelt

- Orientering om den videre proces med byrådets undersøgelse v. Borgerrådgiver Jesper Cortes og ELMANN



1. Nyt fra skadestedet

v. Camilla Sieg og Johnni Hald Sørensen




Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 31. januar 2025

Alling Å - status

Alling Å løber fortsat fint i det nye tracé. Åen blev testet umiddelbart efter nytår, hvor vandstanden var over 1,2 m.


Sugespidserne er slukket på begge sider. Alt ser fint ud indtil videre.

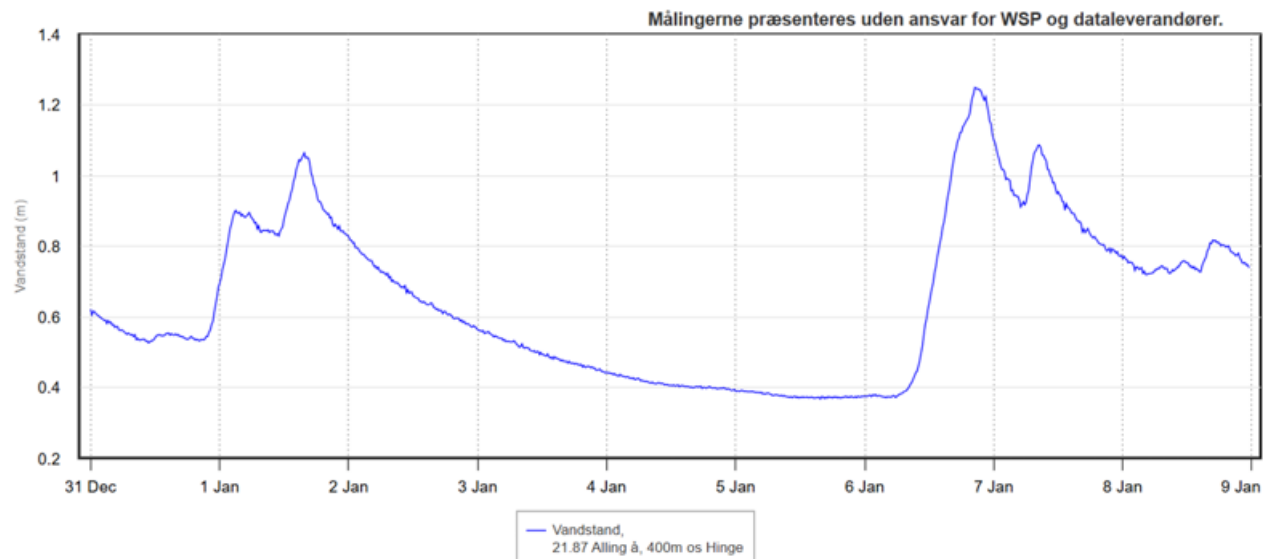

Etablering af vestlig grøft/ dige

For at forhindre vand fra ca. 10 ha, er der etableret en grøft/ dige langs det vestlige matrikelskel.

Det betyder at mængden af vand som skal opsamles og renses bliver mindre.

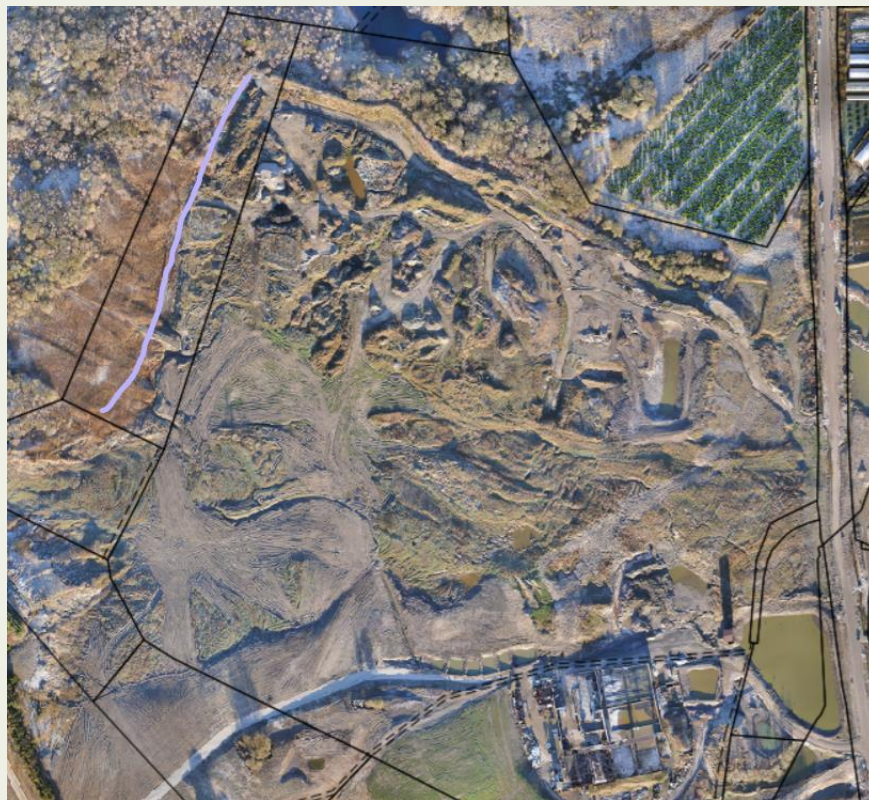



Status bygning og renseanlæg

Renseanlægget er sat i produktion, membraner er bestilt fra USA.

Elementer til bygningen er begyndt at ankomme til skadesstedet.

Der er lavet geotekniske undersøgelser til fundering af bygningen, og det forventes at funderingsarbejdet kan gå i gang i februar.

Regnhændelse efter nytår

Kombinationen af en større mængde regn, derefter snefald efterfulgt af tøvejr gjorde at regnvandsbassinerne på skadesstedet blev fyldte. Bassinet ved Gl. Århusvej blev også fyldt.

Det blev derfor vurderet nødvendigt at tage Assentoft bassinerne i brug. Bassinerne blev taget i brug d. 8. januar om aftenen.

Der måles PH-værdier ugentligt, og der udtages vandprøver månedligt i grøften.



Spuns ved E45



Spunsen ved E45 er klar til at blive trukket, og forventes trukket i uge 7 eller 8. Spunsen har ikke længere en funktion, da der ikke er risiko for forurening af Alling Å.

Der har været forhandling med leverandøren af spunsen, og der er fundet en løsning omkring økonomien.

Sandet fra området anvendes til vejopbygningen af Gl. Århusvej.




Området med jordbunker

Området med jordbunker ligger fortsat uberørt hen.

Området består af adskillige bunker, hvortil vi desværre ikke har hverken kendskab til indholdet eller forureningsgraden.

Vandet fra området ledes til de interne bassiner og renses sammen med det resterende overfladevand.

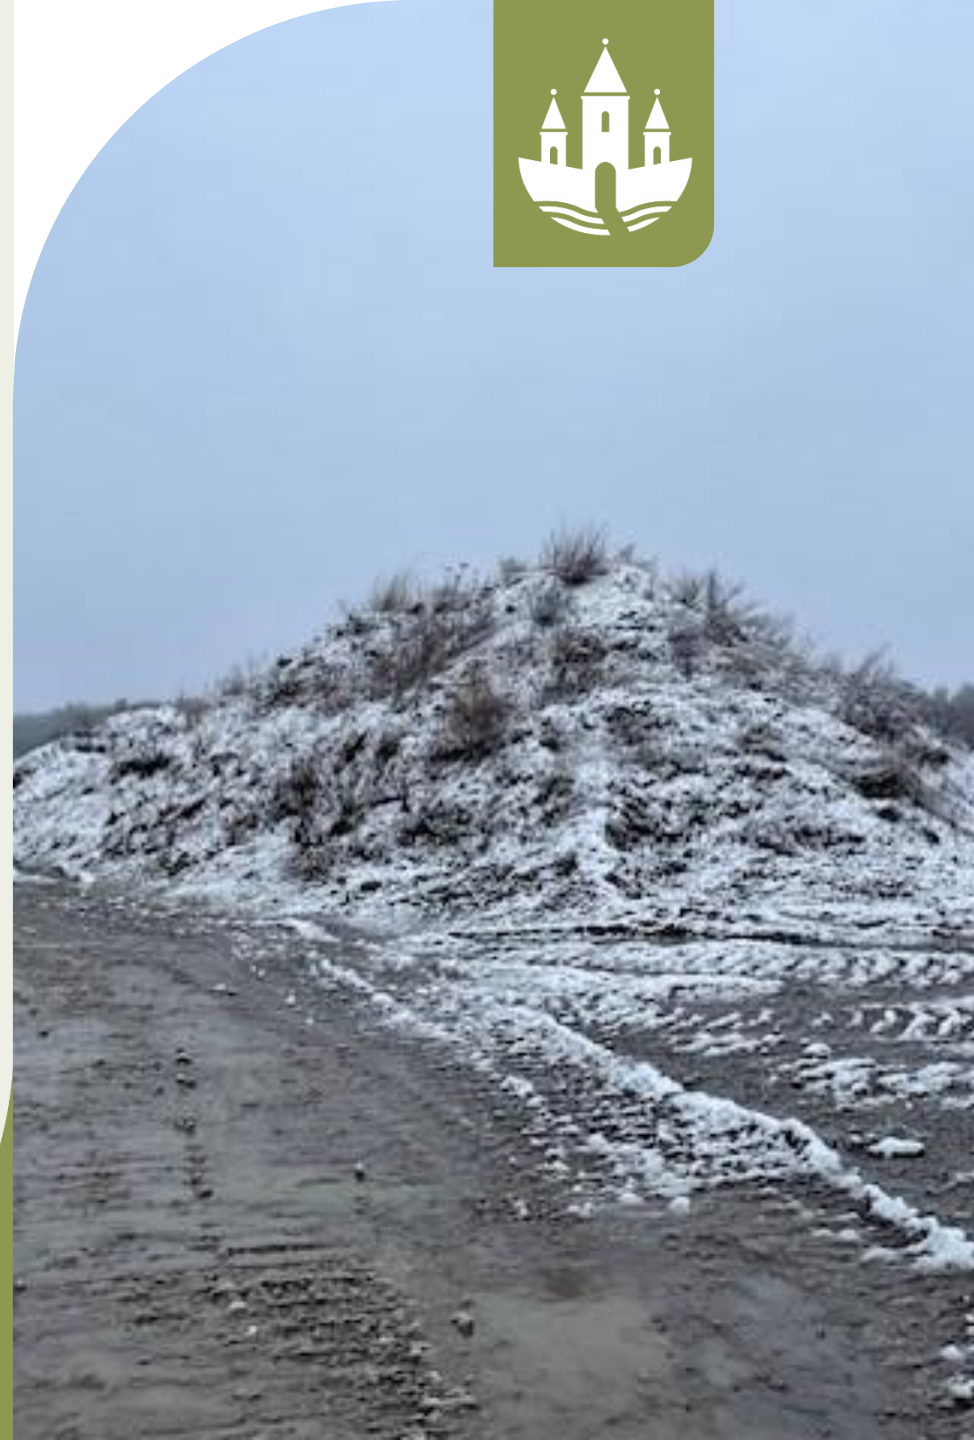

Nordic Waste – undersøgelse af dyb boring

Indtil nu (fra medio november):

- Boring er fundet og frigravet, yderligere forurening standset
- Boring er delvist fyldt med materiale, formentligt fra jordskredet
- Analyse fra selve boringen viser påvirkning fra lettere forurenede jord
- Boring er forlænget op over niveau for jordtip

Næste trin (min. 2 mdr.):

- Opfyld af udgravning/stabilisering omkring boring
- Oprensning af boring
- Kamerainspektion af boring
- Pumpetest og analyser af det dybe grundvandmagasin
- Samlet risikovurdering og afrapportering
- Vurdering af det videre forløb (behov for yderligere undersøgelser, afværge eller andet samt sløjfning)







2. Juridiske forhold

v. Jesper Kaas Schmidt

Juridiske spørgsmål




Status på retssagen DSH Recycling A/S u/konkurs mod Randers Kommune:

- Den 18. december 2024 meddelte konkursboet til retten, at de indtræder i den retssag, som DSH Recycling A/S har anlagt mod Randers kommune.
- Sagen er henvist til Vestre Landsret på grund af dens karakter.
- Vestre Landsret har den 16. januar godkendt, at Miljøstyrelsen træder ind i retssagen til støtte for Randers Kommune.
- Vestre Landsret har endvidere besluttet, at retssagen ikke skal afvente en afgørelse i klagesag ved Miljø- og Fødevarerklagenævnet.
- Alle parter har nu frist til den 20. februar 2025 til at indsende supplerende processkrifter.

Dialog med Regionen

Myndighedsbehandling af jord - Hvordan og Hvem ?

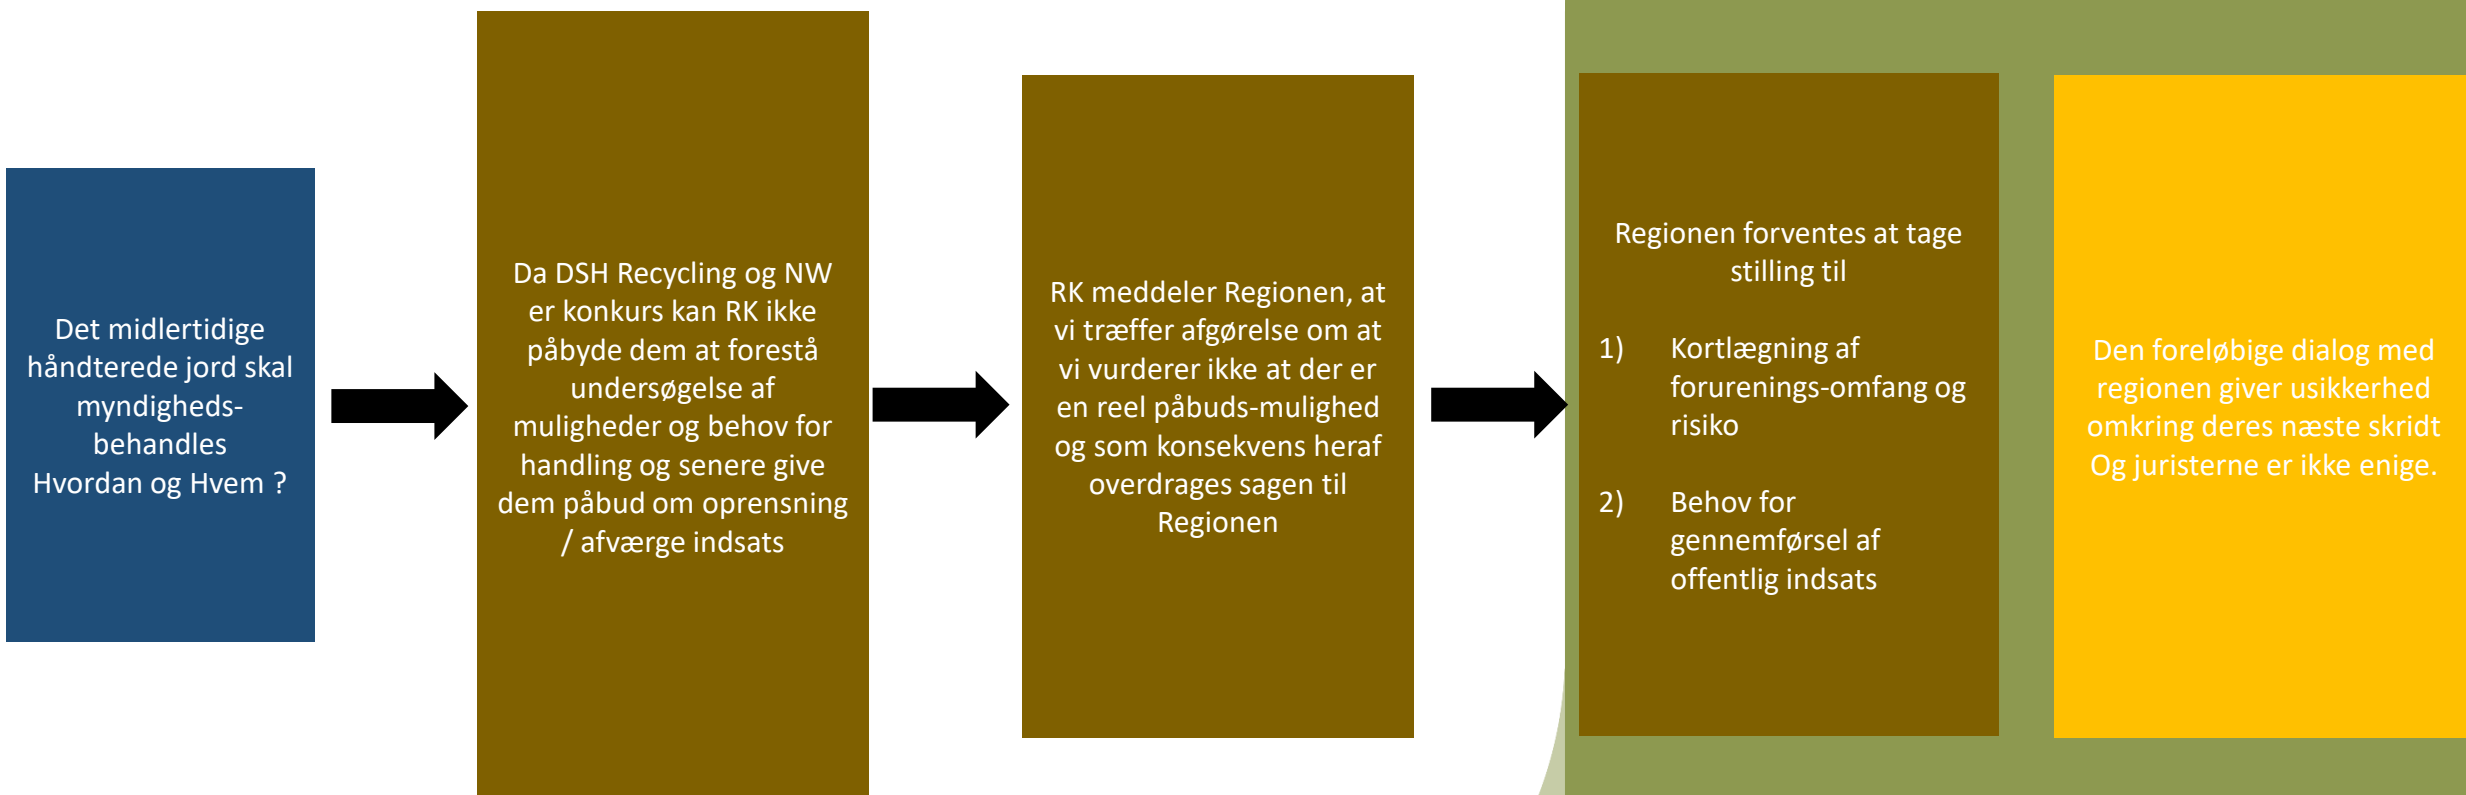

Undersøgelser

De to eksterne undersøgelser er i gang.

- Statens undersøgelse
- Borgerrådgiverens undersøgelse

Forvaltningen understøtter med de materialer der efterspørges. Opgaven er ikke uden omfang:

- Afklaring af ønskede materialer. Undersøger definerer ønskerne.
- Etablering af adgange hertil og fremskaffelse i den ønskede form.
- Løbende dialog med efterfølgende henvendelser om ekstra materialer.
- Vi registrerer de medgåede timer og omkostninger til opgaveløsningen af hensyn til overblikket herover.

Miljøskadeudvalg





3. Økonomi

v. Jesper Kaas Schmidt

Nordic Waste – status økonomi



Randers Kommune har ved udgangen af december 2024 afholdt udgifter vedrørende afværgeforanstaltninger på i alt **484,6 mio. kr.** (ekskl. moms og ekskl. forbrugte timer internt i kommunen). Beløbet fordeler sig på følgende perioder:

Periode	Beløb (mio. kr.)	Bemærkninger
19. december 2023 – 22. januar 2024	121,8	
23. – 31. januar 2024	46,1	Beløbet er endeligt opgjort og viderefaktureret til Miljøstyrelsen.
1. februar - 31. december 2024	316,7	Udgifter finansieres delvist af statsligt tilskud på 146,3 mio. kr., ligesom der er sendt faktura til Favrskov Kommune på 1,6 mio. kr.
I alt	484,6	Randers Kommunes nettoudgifter for 2023-2024 kan dermed opgøres til 290,6 mio. kr.

Samlet økonomi – ændringer i 2024



I 2. halvår 2024 har en række ændringer påvirket økonomien:

- Omlægningen af Alling Å løb ind i nogle udfordringer i efteråret som gjorde projektet dyrere end vi tidligere havde forventet.
- Store mængder regn har betydet mere kørsel med vand – og også ibrugtagning af bassinet på Virkevangen (Assentoft).
- Der er truffet beslutning om etablering af et renseanlæg der er dyrere end hidtil forudsat – som til gengæld giver lavere driftsudgifter (vi bringer dermed de samlede driftsudgifter ned fra forventet 4-7 mio. kr. årligt til nu 2,1 – 3,7 mio. kr. årligt)
- Genetableringen af Gl. Aarhusvej forventes at blive billigere end hidtil forudsat.
- Det har vist sig nødvendigt med en dyrere løsning til sikring af vand i bassin, bentonit-løsning

Forventede udgifter i 2025 og frem



Resterende anlægsudgifter: Op imod ca. 60 mio. kr.

- Rensningsanlæg inkl. forrensning og bygning
- Nedlæggelse af bassin 4-8
- Kørsel med vand
- Reetablering af Gl. Aarhusvej bassin
- Spunskasse Alling Å
- Genetablering af involverede arealer – herunder opkøb af jord for at mindske udgifter til erstatning
- Øvrige udgifter (byggeplads, mindre resterende arbejder, sprinkleranlæg, sugespidsanlæg mv.)
- Buffer til uforudsete udgifter

Driftsudgifter: 3,7 mio. kr. i 2025 faldende til forventet 2,1 mio. kr. i 2027

- Drift af rensningsanlæg
- Drift af bassin Virkevungen
- Vandanalyser og dronemålinger

Bemærkninger og usikkerhed



- Bassinet på Virkevangen (Assentoft) kommer til at være vores reservekapacitet de kommende år. Vi har derfor som udgangspunkt ikke sat penge af til at afvikle bassinet. Kan indgå som en del af et fremtidigt salg.
- Vi har i vores forventning til de samlede udgifter ikke afsat midler til eventuelle retssager – herunder advokatudgifter
- Vi har ikke indregnet udgifter til at finde PFAS inde på NW-arealet, da det ikke er en afværgeforanstaltning.
- Der er usikkerhed omkring størrelsen af erstatninger til lodsejere.
- Indtægter fra evt. salg af rør er ikke indregnet (vi arbejder generelt på at sælge hvad sælges kan).
- I forhold til statens oprindelige afsatte beløb på 195 mio. kr. til finansiering af afværgeforanstaltninger, så har staten brugt 192,4 mio. kr. Randers Kommune har haft anmodet om udbetaling af restbeløbet på 2,6 mio. kr., men har ikke opnået tilsagn herom.
- Hertil kommer øvrige tilgodehavender, ligesom det fortsat forudsættes, at kommunen kan få finansieret sine udgifter via konkursbo/forsikringselskab. Endelig forfølges alle muligheder for finansiering af et eventuelt restbeløb fortsat (statslige puljer mv.).

Samlet økonomi – revideret skøn



Med afsæt i de oplyste ændringer, forudsætninger og usikkerheder kan der opgøres en revideret skøn for den samlede økonomi.

Helt overordnet er det fortsat forventningen at vi ender ud med samlede nettoudgifter for kommunen som ligger under vores tidligere vurdering på 375 mio. kr.

Samlet set er det på nuværende tidspunkt forventningen at de samlede udgifter for indsatsen ender på 540 - 550 mio. kr. - og en efterfølgende driftsudgift på 2,1 mio. kr. i 2027 og frem.

Der kan dog fortsat komme uforudsete udgifter, som ikke kan holdes indenfor den buffer som er afsat.

For Randers Kommune betyder det som udgangspunkt forventede nettoudgifter på **340 - 350 mio. kr. ved udgangen af 2026.**



4. Tidslinje for det videre arbejde

v. Jesper Kaas Schmidt

Det videre forløb ved skadestedet



2025 (1. og 2. kvartal)

- Gl. Århusvej er færdig og åbnet
- Alle bassiner oprenset og retableret
- Renseanlæg og bygning er etableret og idriftssat
- Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er retableret

2025, 3. kvartal og fremover

- Herefter overgår pladsen til en driftssituation



5. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe 2025

v. Jesper Kaas Schmidt

Møder 2025

Foreløbigt planlagte møder:

- 27. februar
- 25. marts
- 23. april

Alle møder afholdes kl. 16.00

Møderne er indkaldt i kalenderen.



6. Eventuelt

Eventuelt

Orientering om den videre proces med byrådets undersøgelse

v. Borgerrådgiver Jesper Cortes og ELMANN

- Orientering om opstart af undersøgelsen, og forløbet af fase 1
- Dialog omkring interview i forhold til byrådets beslutning
- Mulighed for behov for yderligere dialogpunkter
